市町村	能代市

汚水処理整備区域図　　アクションプラン

■目標年次	平成47年

■手法毎の汚水処理整備区域

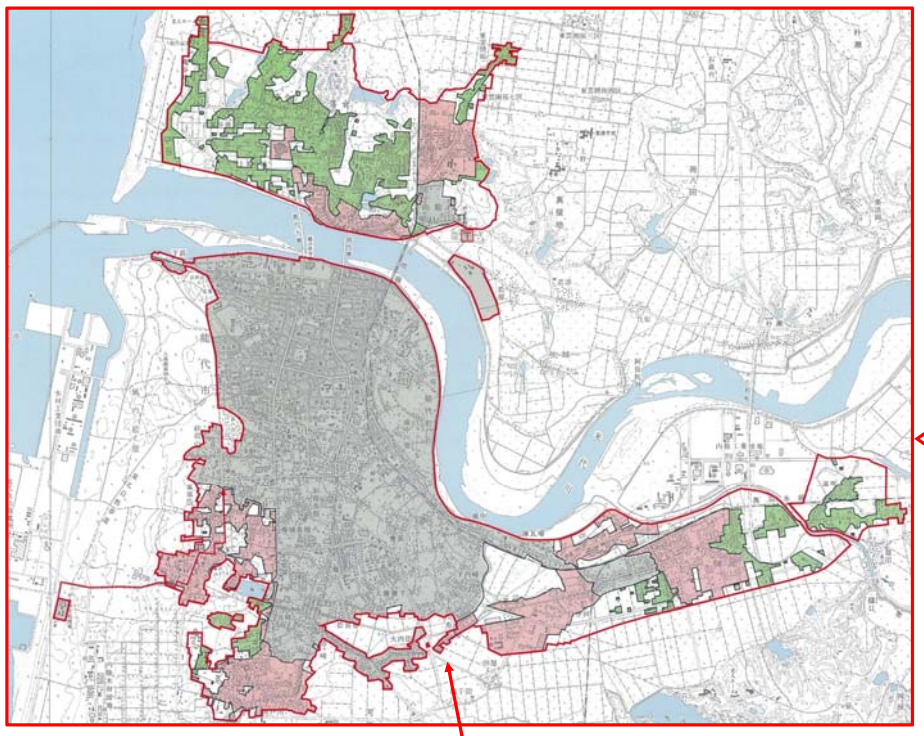

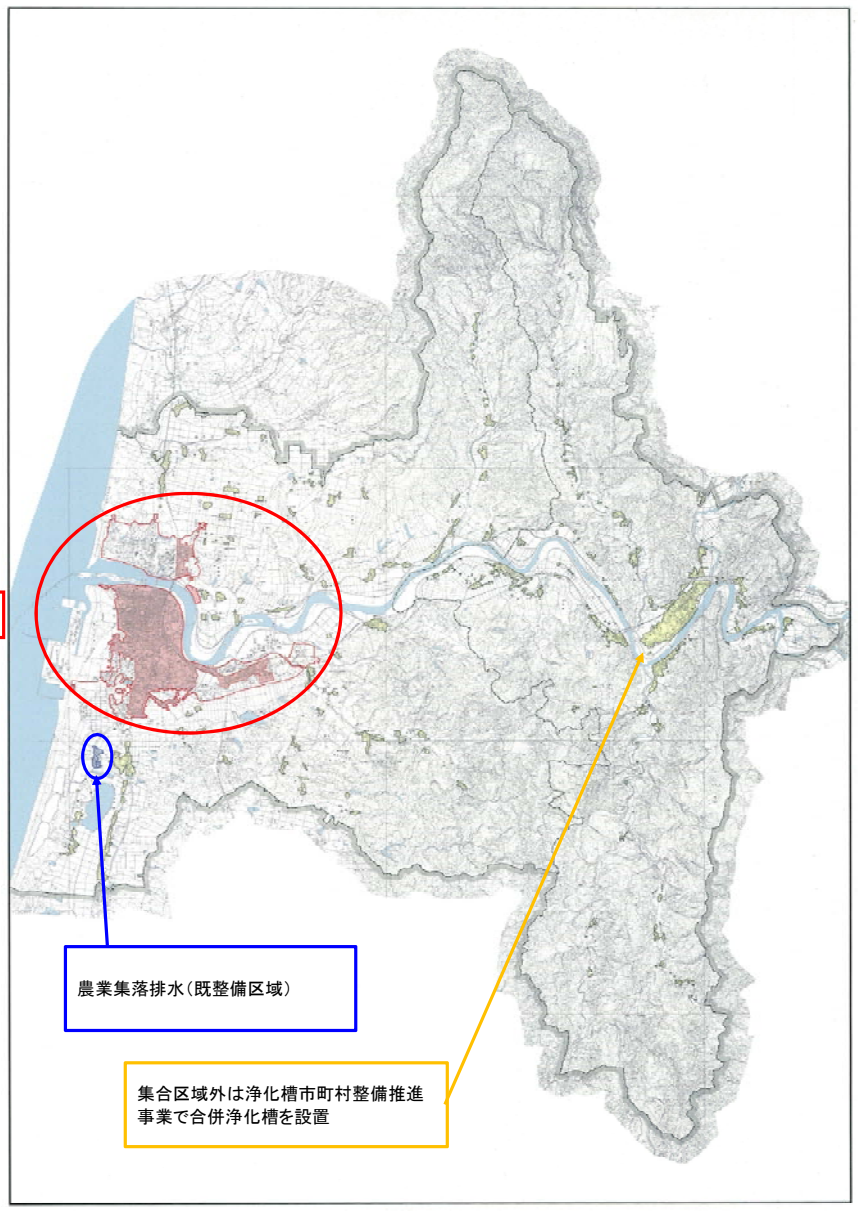

■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
施設整備	下水道	未整備地域の整備																				
	農集排	（整備完了）																				
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業																				
		浄化槽設置整備事業																				
実行メニュー（早期概成）	下水道	期間短縮手法による整備の実施																				
	浄化槽	補助費嵩上げによる設置促進																				

② 目標値及び概算事業費等（中間年次　平成37年末）

			全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考（整備概成手法の内容）
						個人設置型	市町村設置型			
整備手法	整備人口（人）		38,733	27,330	188	6,370	4,845	—	—	【下水道整備】 低コスト手法を取り入れた管渠整備を検討 10年以降の整備区域については、暫定的に浄化槽で対応する。 【浄化槽　個人設置型】 補助費嵩上げによる設置促進
	整備面積（集合処理分）（ha）		1,093.3	1,077.3	16	—	—	—	—	
目標値	汚水処理人口普及率（%）		83.3	58.8	0.4	13.7	10.4	—	—	
	接続率（%）		92.9	90.0	100.0	100.0	100.0	—	—	
概算事業費	総建設事業費（百万円）	H28～H37	8,582	6,990	0	884	708	—	—	
		過年度　累計	43,777	37,622	574	3,319	2,262	—	—	
	年間維持管理費（百万円/年）		495	404	5	—	86	—	—	
整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）			1,130	1,377	3,053	—	467	—	—	
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施		—	○	—	—	—	—	—	
	補助費嵩上げによる設置促進		—	—	—	○	—	—	—	

③ 目標値及び概算事業費等（目標年次　平成47年末）

			全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考（整備概成手法の内容）
						個人設置型	市町村設置型			
整備手法	整備人口（人）		35,863	28,746	149	1,797	5,171	—	—	【下水道整備】 低コスト手法を取り入れた管渠整備を検討
	整備面積（集合処理分）（ha）		1,367.8	1,351.8	16	—	—	—	—	
目標値	汚水処理人口普及率（%）		93.3	74.8	0.4	4.7	13.4	—	—	
	接続率（%）		94.5	93.2	100.0	100.0	100.0	—	—	
概算事業費	総建設事業費（百万円）	H38～H47	7,195	6,485	0	57	653	—	—	
		過年度　累計	50,972	44,107	574	3,376	2,915			
	年間維持管理費（百万円/年）		520	425	4	—	91	—	—	
整備人口1人当たりの建設費用（千円/人）			1,421	1,534	3,852	—	564	—	—	
実行メニュー	期間短縮手法による整備の実施		—	○	—	—	—	—	—	
	補助費嵩上げによる設置促進		—	—	—	—	—	—	—	
